

1 아산문화공원 조성

사업개요

- (사업위치) 아산시 온천동 1225번지 일원
- (총사업비) 470억원
- (사업규모) 98,939m² 공원 조성
 - 주요시설 : 순환동선, 녹지 및 조경시설(수경시설, 어린이놀이기구, 피크닉장, 잔디광장 외), 관리사무소(연면적 446m², 2층) 등
- (사업기간) 2017 ~ 2023.12.

□ 추진배경 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설(공원) 조성으로 사유재산권 관련 민원 해소
- 다양한 시민 수요와 역사, 문화를 아우르는 쾌적한 공원 조성으로 시민이 행복한 여가 및 문화공간 제공

□ 사업진행 현황

- 2017.~2021. 토지보상 및 수용
- 2020. 9. 공원조성계획(변경) 수립
- 2020.12. 충청남도 지방토지수용위원회 토지수용재결
- 2021. 5. 충청남도 건설기술심의 및 아산시 계약심의 등 사전 행정절차 완료
- 2021. 6. 아산문화공원 착공식 및 지장물 철거 실시
- 2021. 9. 아산시-온양민속박물관 상생협력 토론회 개최
- 2021.11. 아산문화공원 조성사업(조경 외) 사업자 선정 및 착공
- 2022. 6. 아산문화공원 주차장(청소년교육문화센터) 확·포장
- 2023.12. 아산문화공원 조성사업 완료(예정)

□ 조감도 및 전경

○ 조감도



○ 전경



답
부
당
서

공원녹지과장 심 용 근 (☎ 2610)

담

당 김 도 권 (☎ 2058)

2 아산IC 진입도로 개설

사업개요

- (사업위치) 아산시 모종동~배방읍 구령리
- (총사업비) 321억원(국 13, 도 60, 시 53, 기타 195)
- (사업규모) 도로개설(4차로) L = 0.8km[교량 L= 118m]
- (사업기간) 2018 ~ 2023

□ 추진배경 및 필요성

- 아산IC(아산~천안 고속도로) 개통에 따른 원도심, 모종동 배방읍 일원에서 고속도로 접근성 향상

□ 사업진행 현황

- 2018. 10. 실시설계 용역 발주
- 2019. 12. 실시설계 완료
- 2020. 3. 보상 착수
- 2020. 7. 실시계획 인가고시, 공사 착공
- 2023. 3. 공사 준공 및 개통

□ 사업효과

- 향후 아산IC(아산~천안) 고속도로) 개통으로 고속도로 접근성 향상 및 온천대로 교통량 분산에 따른 교통편익 제공

□ 위치도



답
당
부
서

도로시설과장 한영석 (☎ 2407)

답

당 김현정 (☎ 6507)

온천대로(풍기~남동) 6차로 확포장 온천교 재가설

사업개요

- (사업위치) 아산시 풍기동~남동 온천교
- (총사업비) 177억원(국 10, 도 97, 시 53, 기타 60)
- (사업규모) 도로확포장(4→6차로) L = 102m, B=31.5m
- (사업기간) 2018 ~ 2023

□ 추진배경 및 필요성

- 국도21호(아산~천안) 8차로 및 모종·풍기지구의 6차로 확장 개통에 따른 온천대로(풍기동~남동 구간) 병목현상으로 교통정체 해소 시급

□ 사업진행 현황

- 2020. 4. 실시설계 용역 완료
- 2020. 6. 지방건설기술심의 완료
- 2020. 11. 공사 착공
- 2023. 9. 공사 준공 및 개통

□ 사업효과

- 온천대로 중 유일한 미확장 구간으로 온천교 확장을 통해 병목현상 해소 및 교통편익 제공

□ 위치도



담당서	도로시설과장 한영석 (☎ 2407)	담당	김현정 (☎ 6507)
-----	---------------------	----	--------------

4 온양5동 행정복지센터 건립사업

사업개요

- (사업위치) 아산시 용화동 677번지
- (총사업비) 80억원
- (사업규모) 행정복지센터 2,314㎡, 지하1층/지상4층
주차타워 1,238㎡, 3층4단(40면)
- (사업기간) 2019. 8. ~ 2023. 6.

□ 추진배경 및 필요성

- 노후화된 청사와 복잡한 주차문제를 해소하고자 추진됨

□ 사업진행 현황

- 2019. 8. 기본계획 수립
- 2020. 4. 건축설계용역 착수
- 2021. 3. 건축설계용역 완료
- 2021. 5. 공사 착공
- 2022. 10. 행정복지센터 및 주민자치센터 임시사용승인 완료
- 2023. 6. 주차타워 완공 및 전체준공

□ 사업효과

- 지속가능한 친환경 에너지 절약형 건축물로서 새로운 환경을 조성하고 불편했던 주차 문제 해소

□ 조감도(위치도) 및 전경



담
부
당
서

공공시설과장 이 강 현 (☎ 2522)

담

당 김 은 새 (☎ 6540)

5 온양천 생태하천 복원사업

사업개요

- (사업위치) 아산시 모종동 ~ 신동 일원
- (총사업비) 21,575백만원 (국 7,030, 도 3,757, 시 10,788)
- (사업규모) 생태하천복원 L=1.2km
- (사업기간) 2016. ~ 2023.

□ 추진배경 및 필요성

- 하천의 수질개선 및 수·생태계 복원을 통한 주민 친수공간 조성
- 하천정비를 통한 재해예방으로 시민의 안전한 주거환경 조성

□ 사업진행 현황


- 2017. 02. 실시설계용역 착수
- 2019. 12. 하천기본계획 수립 고시 (충남 제2019-1184호)
- 2021. 12. 하천공사 시행계획 고시 (아산시 제2021-389호)
- 2021. 12. 공사 착공
- 2023. 12. 공사 준공 (예정)

□ 사업효과

- 하천 수생태계의 다양성 확보 및 생태적 건강성 회복
- 하천 생태복원 및 수변 정비를 통해 시민들에게 수변문화공간 제공

□ 위치도 및 전경

○ 위치도

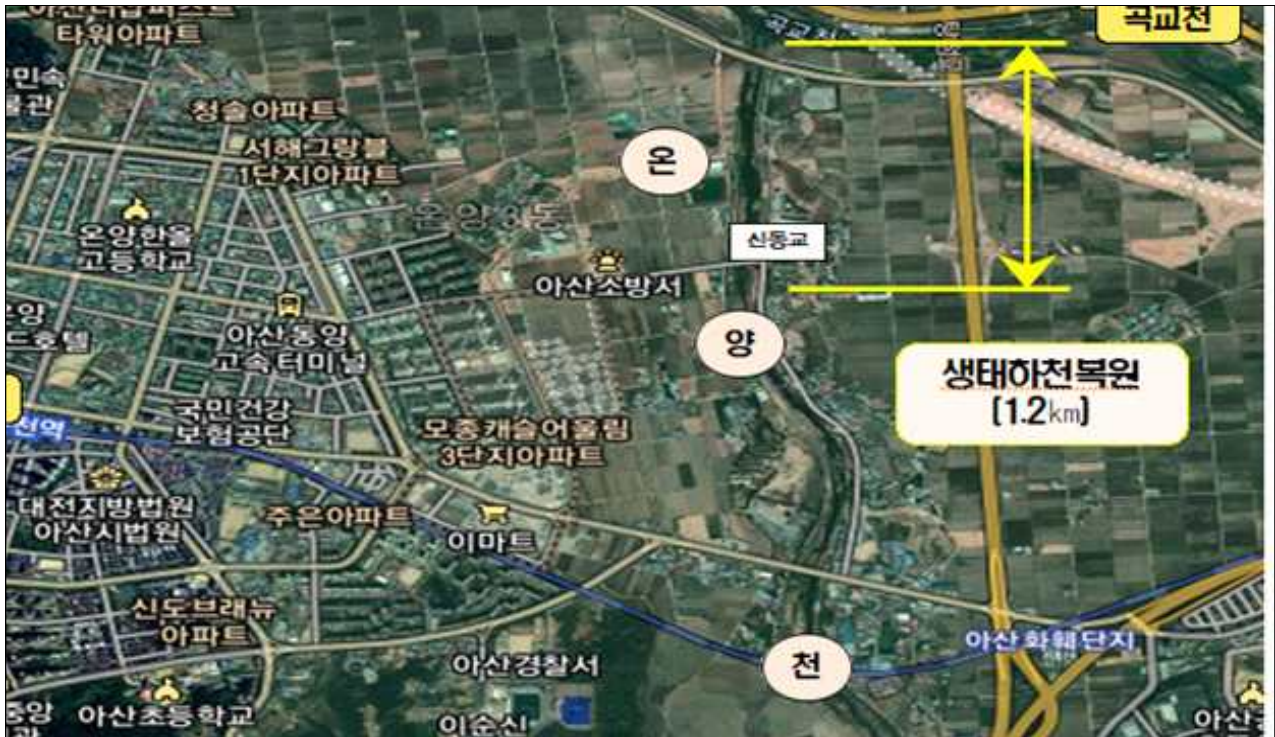

○ 전 경



답
당
부
서

생태하천과장 서 종 경 (☎ 2031)

답

당 한 상 길 (☎ 2801)
